

鳥羽河内ダム建設事業 進捗状況 令和7年9月30日現在

R6付替道路工事(その6)
R7.3月～R8.1月
進捗率：約85% ④

R6付替道路工事(その3)
R7.1月～R7.11月
進捗率：約75% ③

R6付替道路工事(その2)
R7.3月～R8.1月
進捗率：約66% ②

鳥羽河内ダム本体工事
R5.10月～R10.4月
進捗率：約31% ①

R6放流設備工事
R6.8月～R8.8月
進捗率：約51% ⑨

進捗状況は下記サイトでも紹介しています↓




フォロー＆チャンネル登録よろしくお願いします！


②付替道路工事



鳥羽河内ダム概略平面図

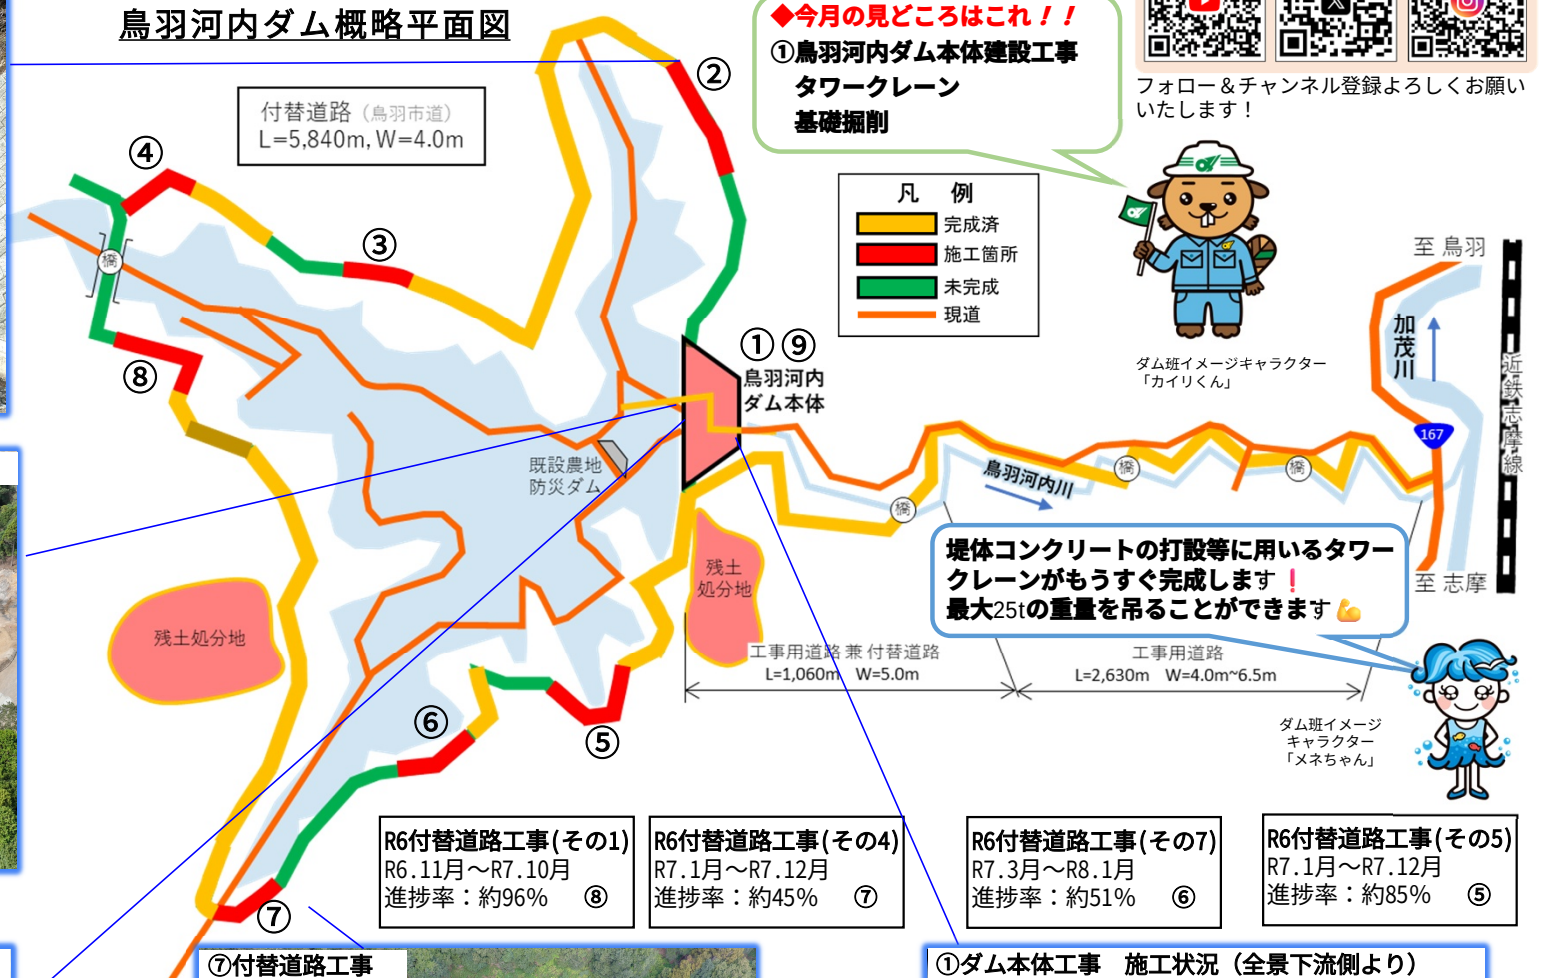

①ダム本体工事 タワークレーン

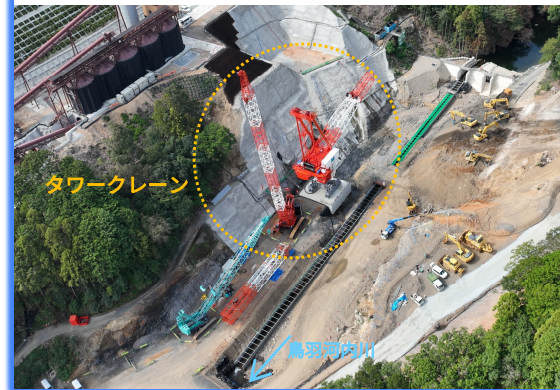


①ダム本体工事 掘削状況（左岸天端より）



⑦付替道路工事



①ダム本体工事 施工状況（全景下流側より）

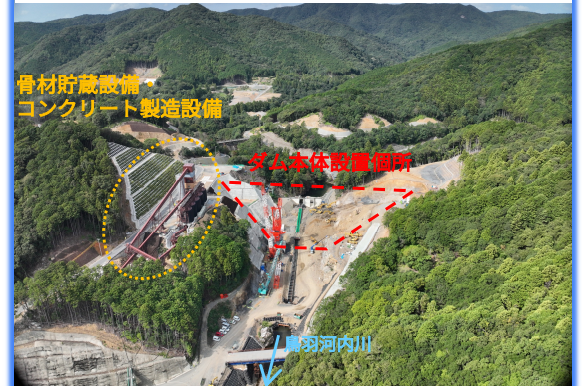

令和6年9月30日



令和7年7月31日



令和7年9月30日



令和7年11月末状況
掲載予定！
