

鳥羽河内ダム建設事業 進捗状況 令和8年7月31日現在

R7付替道路工事(その1) R7. 10月～R8. 9月 進捗率: 約95% ②	R7付替道路工事(その3) R8. 1月～R8. 11月 進捗率: 約79% ④	R7付替道路工事(その2) R8. 3月～R9. 1月 進捗率: 約28% ③	鳥羽河内ダム本体工事 R5. 10月～R10. 4月 進捗率: 約54% ①	R7放流設備工事(その2) R7. 8月～R9. 3月 進捗率: 約30% ⑩	R6放流設備工事 R6. 8月～R8. 8月 進捗率: 約96% ⑨
--	--	---	--	---	--

進捗状況は下記サイトでも紹介しています！



県土整備部
YouTube

河川課 X

河川課
Instagram



フォロー＆チャンネル登録よろしくお願いたします！

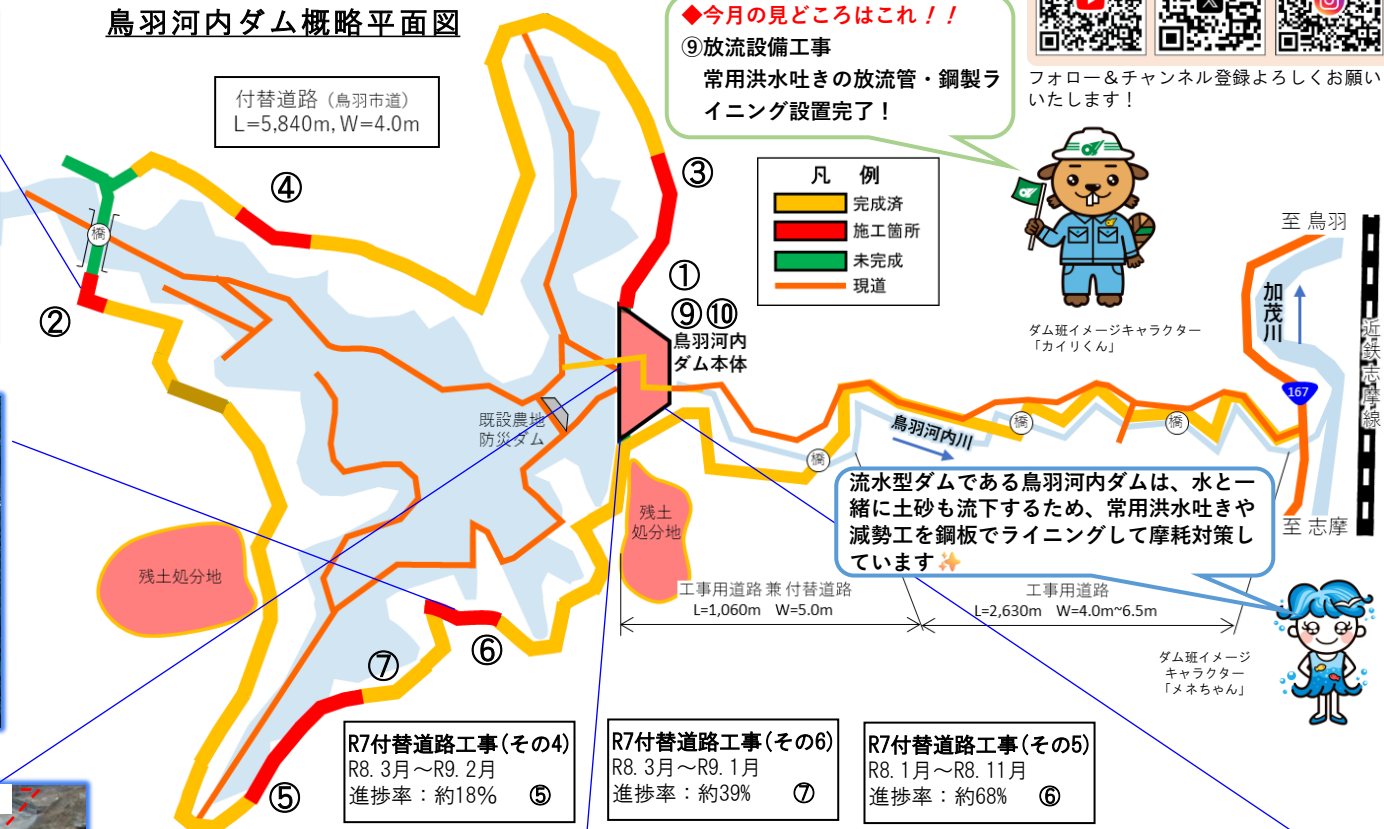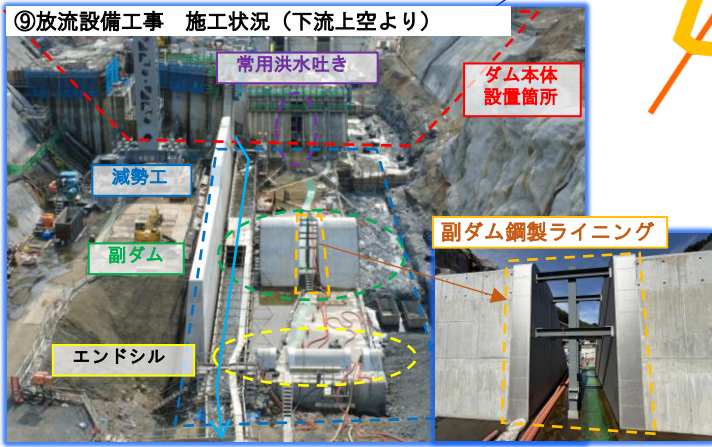

令和6年9月30日




令和7年9月30日



次回 令和8年9月末状況を掲載予定！

令和8年5月31日

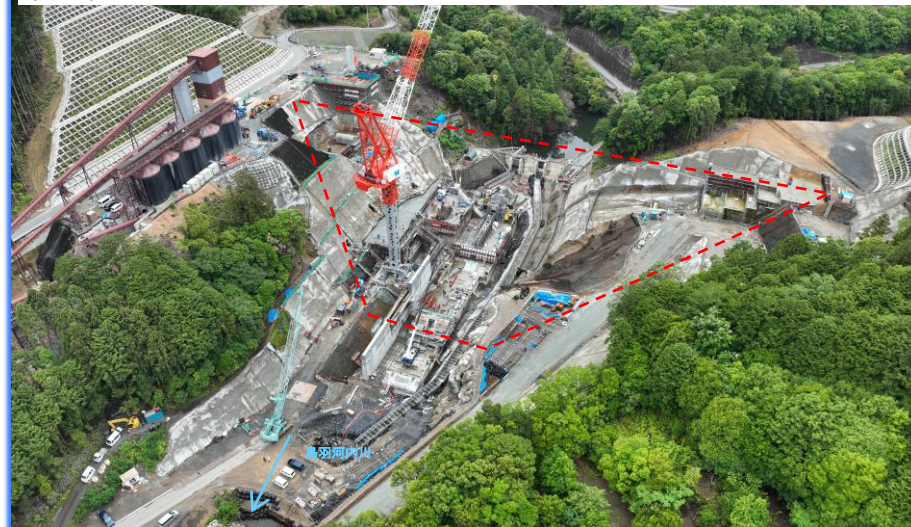

令和8年7月31日

