

一般国道260号(木谷バイパス)道路改良(木谷トンネル(仮称))工事の進捗状況について(平成27年4月末現在)

一般国道260号(木谷バイパス)の木谷トンネル(仮称)(延長433m)の工事進捗(平成27年4月末現在)について、お知らせします。


現在、平成27年12月の完成に向けて、平成26年10月より掘削をおこなっていましたが、平成27年4月25日に起点側(志摩市側)へ貫通しました。

【工事内容】

- (1) 工事名：一般国道260号(木谷バイパス)道路改良(木谷トンネル(仮称))工事
- (2) 工事箇所：志摩市浜島町南張～度会郡南伊勢町木谷地内
- (3) 工事概要：トンネル延長 433m、幅員 車道6.0m、全幅9.75m、
内空断面 56.8m²
- (4) 受注者：日本土建・稲葉建設・谷口建設特定建設工事共同企業体
- (4) 工期：平成26年6月27日～平成27年12月18日



トンネル工事の進捗

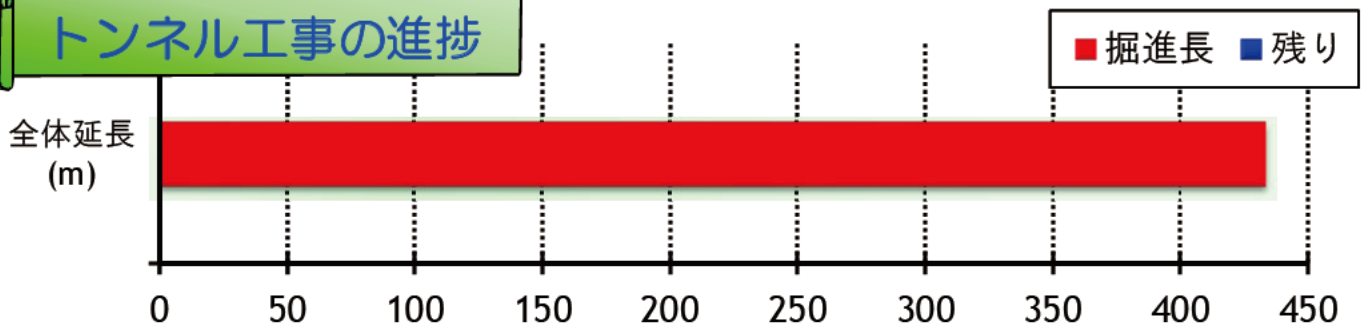

月	12月	1月	2月	3月	4月
掘進長(m)	140/433	220/433	300/433	385/433	433/433
掘削進捗(%)	32	51	69	89	100
工事進捗(%)	26	33	42	50	59

現場風景



<トンネル作業状況>

終点側（南伊勢町側）の坑口では、坑門工の作業に取り掛かりました。

現場風景

起点側坑口の状況



＜起点側坑口＞
トンネル掘削作業が順調に進み、
4月25日に貫通しました。

坑口（起点側）の上部から下部に
掘削をおこないました。



＜起点側坑口＞
現在の状況

