

# 一般国道260号(木谷バイパス)道路改良(木谷トンネル(仮称))工事の進捗状況について(平成27年12月末現在)

一般国道260号(木谷バイパス)の木谷トンネル(仮称)(延長433m)の工事進捗(平成27年12月末現在)について、お知らせします。


トンネル本体工事については、平成27年12月17日に完成しました。

## 【工事内容】

- (1) 工事名：一般国道260号(木谷バイパス)道路改良(木谷トンネル(仮称))工事
- (2) 工事箇所：志摩市浜島町南張～度会郡南伊勢町木谷地内
- (3) 工事概要：トンネル延長 433m、幅員 車道6.0m、全幅9.75m、  
内空断面 56.8m<sup>2</sup>
- (4) 受注者：日本土建・稲葉建設・谷口建設特定建設工事共同企業体
- (5) 工期：平成26年6月27日～平成27年12月18日



## トンネル工事の進捗

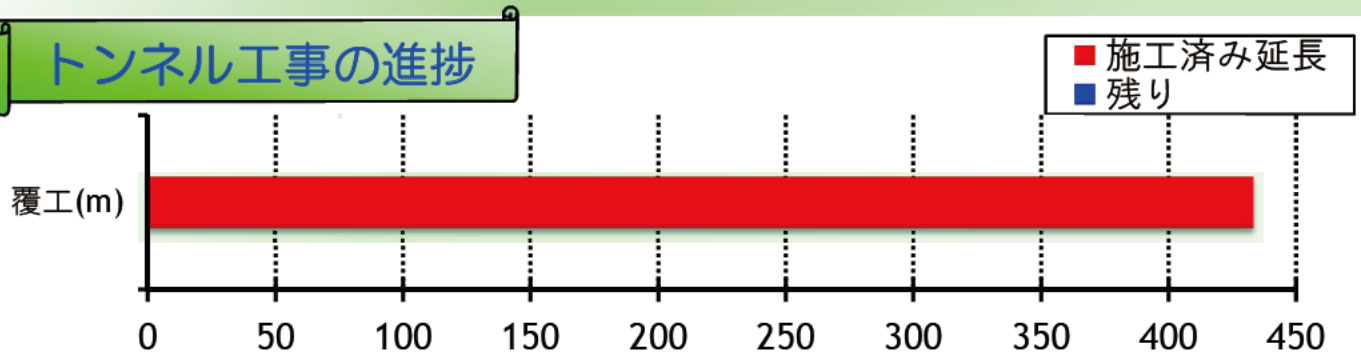

月	8月	9月	10月	11月	12月
覆工長(m)	427/433	433/433	433/433	433/433	433/433
覆工進捗(%)	98	100	100	100	100
工事進捗(%)	86	92	95	99	100

※平成27年4月25日に起点側（志摩市側）へ貫通

## 現場風景



< 終点側坑口の状況 > （南伊勢町側）



## 現場風景

＜起点側坑口の状況＞（志摩市側）



＜終点側付近＞（南伊勢町側）



＜起点側付近＞（志摩市側）



## 今後の工事

木谷トンネルについては、トンネル本体工事が完成し、トンネル内の照明灯設置工事を進めていきます。

なお、現在トンネル前後の道路改良工事や舗装工事を進めています。

木谷バイパスの完成については、平成28年3月末を予定しています。
